

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-064 | ID Orden SAP: 14021 | Fecha: 2019-09-10

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	C-SUR-2199 PORTAL DE MIRASUR	ID Proyecto:	10827
Cliente:	INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.	Código Cliente:	C96791150-K
Dirección:	AV REPUBLICA SN C/CHORRILLOS	Comuna:	Osorno
Ciudad:	OSORNO	Constructora:	
Contacto:	Sin obs.		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	MATIAS DUPRE	Técnico:	Jaime Espinoza
Instalador:	JORGE CARDENAS	Tel. Instalador:	9612 26961
Prof. Obra:	-	ITO:	-

DETALLE TÉCNICO

Motivo Visita: 1

Observaciones Generales:

Se entrega máquina de fusión reparada, serie FC-12660. Atiende y se informa de la visita al Sr Luis Banderas, Supervisor de instalaciones. Nota: Recibe documento el Sr Jorge Neumman, Asistente Técnico en Obra (A.T.O).

Muros / Tabiques:

En los deptos. 201, 205, 206, 208, 209 y 210 del segundo piso de la torre uno. Se observan que todo atravesio de metal y fijación del material mencionado, se encuentra protegidos (encamisado), para evitar cortes en la red y de evitar el roce hacia la tubería, en el sector de cocina, calefón, baño, etc.

Matriz:

Consiste en HDPE, sin ejecución en la Torre Uno. Se aprecia tubería a la vista en PPRCT (S3.2) Bajo losa y sin ejecución en las instalaciones de agua potable de Ø 25mm. Se recomienda colocar Puntos Fijos (PF) antes y después de cada unión y que no supere lo 03cms de este. Aplicar, en todos los fitting's por fusionar (Codos, coplas, derivaciones, etc.), para poder reducir el golpe de ariete. También, aplicar Puntos deslizante (PD) a metro de distancia de uno y el otro. (Primer y segundo piso de la Torre Uno). Se deja escrito la NCH 3202 en los puntos 5.5.2 y 5.5.3.

Losa:

Sin trabajos de fusion en las Torre Uno y Dos.

Almacenaje:

Acopio ordenado y protegido.

Exteriores:

Se conceden gramiles al personal de gasfitería en terreno (Gasfíter).

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



IMG 9903 min

Polifusión
 Reporte de Retiro / Entrega Máquinas

N° Folio: 016549
 Fecha: 16/09/19

Cliente: Municipalidad de Lampa
 Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DE LA PAZ
 Técnico: ALFREDO BARRERA

Entrega: ☒ Retiro: ☐

1 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

2 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

3 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

4 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

5 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

Observaciones: *Retiro de la máquina*

Técnico: *Alfredo Barrera* Cliente: *[Signature]*

IMG 9902 min

Polifusión
 Reporte de Retiro / Entrega Máquinas

N° Folio: 016549
 Fecha: 16/09/19

Cliente: Municipalidad de Lampa
 Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DE LA PAZ
 Técnico: ALFREDO BARRERA

Entrega: ☒ Retiro: ☐

1 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

2 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

3 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

4 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

5 Modelo Máq. Temperatura ☐ Cordon ☐ N° Serie ☐ Otro ☐
 Problema presentado: ☐

Observaciones: *Retiro de la máquina*

Técnico: *Alfredo Barrera* Cliente: *[Signature]*


IMG 9901 min



IMG 9898 min



IMG 9897 min

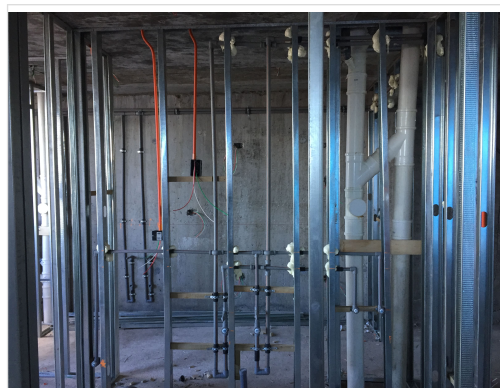

IMG 9896 min



IMG 9892 min



IMG 9890 min



IMG 9889 min



IMG 9888 min

VALIDACIÓN

Jaime Espinoza
Técnico Polifusión

INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
Aceptación Conforme
