Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	INFORME DE INCIDENCIA	INFORMES 800	
		N°	05

REGISTRO DE INFORMACIÓN			FECHA DETECCIÓN
☐	Proveedor	Nombre: Constructora Tefra Rut: 85.377.600-9 Lugar: Oficina/Bodega del cliente.	15-09-2015
☐	Producción		HORA
☐	Servicio		N/A
☑	Queja Cliente		PERSONA QUE DETECTO
☐	Otros		Cliente

DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA

Tuberías de 16mm Beta S 3,2, Presentan mayor diámetro nominal.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Se realizara visita con fines de tomar mediciones a las tuberías que se encuentran en la bodega de Tefra ubicada en Aldunate, comuna de Santiago.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS
27-08-2015	**Se realiza visita técnica en bodega de Tefra, junto con medir las tuberías de 125mm beta fibra, se tomaron medidas a las tuberías de 16mm, para realizar este procedimiento se contó con 1 pie de metro digital y 1 circometro. Atiende Erick Fuentes Jefe Bodega de Tefra.** **Las medidas obtenidas en forma aleatoria a las tuberías se encuentran entre los rangos 16,1 y 16,8mm, concentrándose la mayoría entre los 16,4 y 16,8. Visita se encuentra descrita en el Folio N° 2352. Realizada por Sergio Rojas Pedrero.** **La norma 3151/1 of 2008 establece para las tuberías 16mm un diámetro nominal de 16,0 a 16,3mm.**
15-10-2015	**Se envía informe de incidencia e informe de visita adjunto para su evaluación en comité.**
-	**ACCION CORRECTORA AROBADA**
-	**RESULTADO FINAL/ACCIÓN CORRECTORA APLICADA**

OBS:

FECHA DE CIERRE: Haga clic aquí para

Avenida Cacique Colín N° 2525- Lampa – Santiago
Teléfono 7452000 – Fax 7453000 – Casilla 10165 Correo 21
www.polifusion.cl – E-mail: info@polifusion.cl

Datos Adjuntos:
Visita N° Folio 2532.

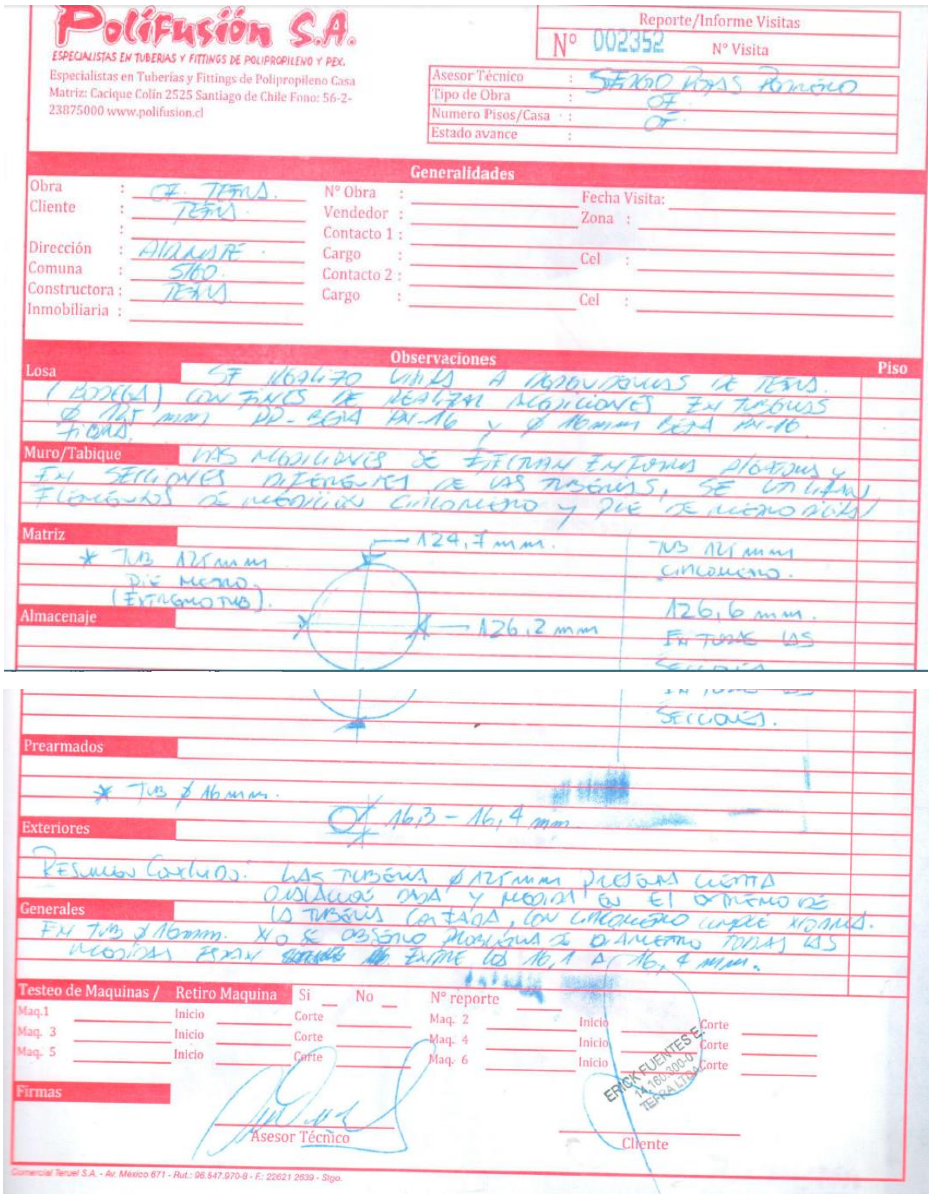

Polifusión S.A.

ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y FITTINGS DE POLIPROPILENO Y PEX.

Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno Casa Matriz: Cacique Colín 2525 Santiago de Chile Fono: 56-2-23875000 www.polifusion.cl

Reporte/Informe Visitas
N° 002352 N° Visita

Asesor Técnico : SERGIO PAZAS ROMERO
Tipo de Obra : OF
Numero Pisos/Casa : OF
Estado avance :

Generalidades

Obra : OF. TERUS.
Cliente : TERUS.
Dirección : ALMANSRE.
Comuna : STGO.
Constructora : TERUS
Inmobiliaria :

N° Obra :
Vendedor :
Contacto 1 :
Cargo :
Contacto 2 :
Cargo :

Fecha Visita:
Zona :
Cel :
Cel :

Observaciones

Piso

Losa: SE RECALCA VISITA A REPARACIONES DE TERUS. (BODEGA) CON FALLAS SE REALIZAN ALCIONES EN TUBOS Ø 125 mm DD-REGA PN-16 Y Ø 16 mm REGA PN-16 FITTINGS.

Muro/Tabique: LAS MODIFICACIONES SE EFECTUAN EN FORMA PLASTICA Y EN SECCIONES DIFERENTES DE LAS TUBERIAS, SE UNIFICAN FLANGEADOS DE MODIFICAR CIRCUNFERENCIA Y QUE SE MUEVA PLASTICA.

Matriz: * TUB 125 mm DIÉ MENOR (EXTINGUIDO TUB).

TUB 125 mm CIRCUNFERENCIA. 126,6 mm. EN TODAS LAS SECCIONES.

Almacenaje:

Prearmados: * TUB Ø 16 mm.

Exteriores: Ø 16,3 - 16,4 mm

RESUMEN CONCLUSIÓN: LAS TUBERIAS Ø 125 mm PRESENTAN CUENTA DESCALIBRADA Y MODIFICACIÓN EN EL DIÁMETRO DE LAS TUBERIAS CORTADA, CON CIRCUNFERENCIA CAMBIE FORMA.

Generales: EN TUB Ø 16 mm. NO SE OBSERVA PLASTICA DE DIÁMETRO TODAS LAS MEDIDAS ESTAN ENTRE LOS 16,1 A 16,4 mm.

Testeo de Maquinas / Retiro Maquina Si __ No __ N° reporte

Maq.1	Inicio	Corte	Maq. 2	Inicio	Corte		
Maq. 3	Inicio	Corte	Maq. 4	Inicio	Corte		
Maq. 5	Inicio	Corte	Maq. 6	Inicio	Corte		

Firmas

Asesor Técnico

Cliente

ERICK FUENTES E. 16.165.000-0 TÉCNICO

Comercial Teruel S.A. - Av. Mexico 671 - Rut.: 96.547.970-8 - F.: 22621 2639 - Stgo.
